

令和元年度 事務事業総点検シート(1)
[平成30年度事務事業]

一般会計		事務事業分類			詳細点検
事務事業名	原池公園事業(野球場整備)			シート番号	D 建設・整備事業
担当部署名	文化観光	局	スポーツ	部	スポーツ施設 課 評価責任者(課長名)
					08-17
					清水

Ⅰ. 基本情報

基本情報	1	堺市マスタープランの政策体系に基づく事業の位置付け	政策	2	誰もが幸せで、暮らしの質の高いまちを実現します	後期実施計画の位置付け
			施策	4	スポーツと健康づくりの推進	有
	2	事業開始年度	平成 23 年度		終了(予定)年度	令和 1 年度
	3	根拠法令等(法令、条例、規則、要綱等)	スポーツ基本法			
	4	関連計画	第2次堺市スポーツ推進計画			
5	事業実施の経緯	政令指定都市で唯一公式認定規格または2,000人以上収容できる野球場がなく、堺市内で一定規模以上の大会が開催できない。また、大和川以南では、全国高等学校野球選手権大阪大会(高校野球夏季予選)が開催されておらず、野球を身近に親しめる環境の提供、スポーツ観戦に親しめる機会の提供が必要なことから事業に着手した。				

Ⅱ. 事業概要

事業概要	6	事業の実施主体(誰が実施しているのか。)	<input checked="" type="checkbox"/> 本庁 <input type="checkbox"/> 各区 <input type="checkbox"/> 出先機関 () <input type="checkbox"/> 市外郭団体 <input type="checkbox"/> 地域団体・市民 <input type="checkbox"/> 民間企業・NPO <input type="checkbox"/> その他 ()			
	7	事業の対象(誰を、何を対象としているのか。)	施設利用者			
	8	事業の目的(どのような状況にしたいのか。)	市民が野球に親しめる(みる・する)質の高い環境を提供する。			
	9	事業内容(スケジュール、実施方法・手段、事業ボリュームなど)	○事業内容 高校野球や社会人野球、プロ野球2軍戦等の公式戦が開催でき、市民が質の高い環境で野球に親しむことができ、レベルの高い試合などを観戦できる本市初の本格的な野球場(収容人数5,000人)を整備する。 整備予定地である原池公園は既に体育館、スケートボードパークが整備され、日常のスポーツ・レクリエーションの活動の場となっている。計画面積17.5haのうち未開設面積が約10.1haあり、野球場の整備とともに、健康・レクリエーション機能を充実し、安全・安心で景観に配慮した公園整備を行う。 ○事業スケジュール(予定) 令和元年度 野球場完成 令和3年度 公園全体完成			
10	直接実施以外の主な支出先	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> 負担金 <input type="checkbox"/> その他 ()				
		委託業者				

Ⅲ. 投入量


項目	単位	H28年度決算	H29年度決算	H30年度決算	R1年度予算
事業費 (a)	千円	74,743	51,742	1,213,040	1,839,372
11 主な事業費内訳	測量・周辺調査業務	千円	0	0	
	基本設計策定業務、実施設計策定業務	千円	74,648	0	
	原池公園第3期区域整備工事	千円		51,670	1,204,715
	その他	千円	95	72	154,645
	国・府支出金	千円	35,000	0	445,000
	財源内訳	千円			
	市債	千円	35,600	38,200	636,500
その他()	千円				
一般財源	千円	4,143	13,542	131,540	
12 人件費 (b)	千円	8,200	9,102	9,102	9,477
13 総コスト(c)=(a)+(b)	千円	82,943	60,844	1,222,142	1,848,849

令和元年度 事務事業総点検シート(2)

事務事業名	原池公園事業(野球場整備)	シート番号	08-17
-------	---------------	-------	-------

Ⅳ. 評価(測定・分析)

ロジックモデルの考え方

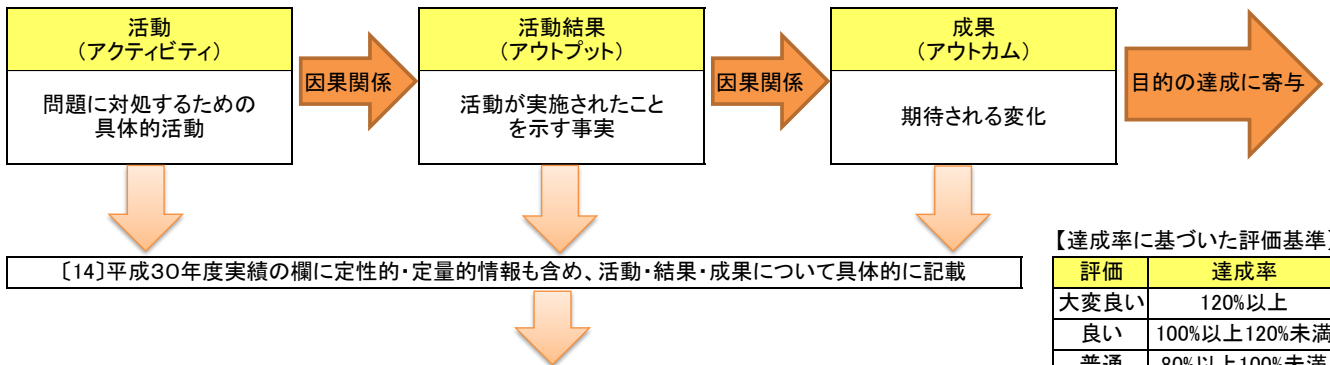

【達成率に基づいた評価基準】

評価	達成率
大変良い	120%以上
良い	100%以上120%未満
普通	80%以上100%未満
少し悪い	60%以上80%未満
悪い	60%未満

事業の活動内容や成果

平成30年度実績							
14	野球場建設工事に着手し、工事を継続している。						
15	指標名	単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
	野球場竣工に向けた活動状況	-	目標値	実施設計	基盤整備工事等	野球場建設工事	野球場完成
			実績値	実施設計	基盤整備工事	野球場建設工事	
			達成率	100%	90%	95%	
			評価	良い	普通	普通	
算出方法・設定根拠など							
16	指標名	単位	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	
			目標値				
			実績値				
			達成率				
			評価				
算出方法・設定根拠など							

業績の分析

17	目標を達成できた、または達成できなかった要因についての分析 (その他、関連情報に基づいた分析)
	工事に際して必要な地盤改良や台風の発生等による影響もあったが、概ね順調に工事進捗している。

【分析のチェックポイント】

- 事業の達成度はどうでしたか。
- 5W2Hを踏まえて、実施過程に問題はありませんでしたか。
- 資源投入は適切でしたか。
- 事前想定できない外的要因の影響はありませんでしたか。
- 事業の有効性は高いですか。低いですか。
