

整備状況調査 整備状況 一覧

資料1

① 樺・美木多駅周辺

				整備時期			備考	資料 ページ
				～H30	R1 R2	R3～		
1	鉄道駅舎	誘導案内情報施設の整備	トイレ、多機能トイレの音声案内の設置	●				
		設備・施設の改良	トイレ、多機能トイレの改良	●				
		その他	筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				
			コミュニケーションボードの導入	●				
2	駅前広場	誘導情報案内施設の整備	バス路線図等の設置			○	今後の駅前広場整備にあわせて実施予定 (R5年度実施予定)	
			主要施設案内図の設置			○		
		設備・施設の改良	ベンチ等の設置			○	今後の駅前広場整備にあわせて実施予定 (R4～R5年度実施予定)	
			エレベーターの設置		●		R2実施完了	8
3-1	南区役所	視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備				案内窓口は執務室等のレイアウト変更に伴い位置が変わる可能性があるため、最も出入り口に近い1階市民課窓口までの誘導ブロックを整備し、職員による案内で対応。	
		誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの改良 (明度差、JIS規格化)	●				
			正面出入口における音響案内設置			○		
			案内情報設備の充実(インターホン明示)			○		
			緊急時、災害時の文字・音声等での案内			○		
			一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付			○		
		設備・施設の改良・整備	多機能トイレの改良(照明の改良)	●				
		その他	筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				
			コミュニケーションボードの導入	●				

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定

		整備項目		～H30	R1 R2	R3～	備考	資料 ページ
3-2	桐文化会館	誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの改良(明度差、JIS規格化)			○	令和2年度に特定天井の改修工事を予定しており、改修工事完了後に実施予定。	
			緊急時、災害時の文字・音声等での案内			○		
			一般トイレ、多機能トイレ便房内ボタン等への点字貼付	▲		○	多機能トイレについては実施済み。 一般トイレは今後実施予定。	
		設備・施設の改良・整備	多機能トイレの改良 (オストメイト対応、水栓ボタン、荷物フック)	▲		▲	オストメイト対応、水栓ボタンは実施済み。 荷物フックは今後実施予定。 ホール多機能トイレに荷物置き用の台を設置	9
			トイレの改良(荷物フック)			▲	ホールトイレに荷物フックを取り付け	10
			舗装材の改良(屋外デッキタイル)			○		
		その他	障害物の撤去(玄関マット)	●				
			筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				
			コミュニケーションボードの導入	●				
3-3	泉北高等 支援学校	誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの敷設位置の改良 (駐車マスを横断しない位置に変更)	●				
		その他	障害物の撤去(誘導ブロック上の傘立等)	●				
3-4	南堺警察署	垂直移動施設の整備	階段手すり等の改良(正面出入口適正な太さに)			○	施設整備に係る予算が大幅に減少しており、緊急修理対応以外の施設整備が困難であるため、整備時期未定。	
		視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備(階段、屋内)			○		
		設備・施設の改良・整備	段鼻の視認性向上(正面出入口)			○		
		その他	筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				
			コミュニケーションボードの導入	●				

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定

		整備項目		～H30	R1 R2	R3～	備考	資料 ページ
3ー5	咲花病院	視覚障害者誘導施設の整備	案内窓口までの誘導ブロック整備			○	R6年度を目途に病院の建て替えを検討中。 建て替えに合わせて整備予定。	
		誘導案内情報施設の整備	案内情報設備の充実(正面入口付近:多機能トイレ・エレベーター誘導サイン、 屋外:車いす使用者用駐車施設から建物入口誘導サイン)	●			玄関前の道路を含め舗装工事を実施。 正面入口に誘導サイン表示。	
			案内情報設備の充実(わかりやすいサインへの改良)	●				
			触知図板の設置			○	R6年度を目途に病院の建て替えを検討中。 建て替えに合わせて整備予定。	
4	駐車場	垂直移動施設の整備	スロープの改良	●				
5	都市公園 (西原公園)	水平移動施設の整備	園路の改良(平坦で円滑な路面確保)			○	令和3年度より実施(設計・工事) R3年度 設計実施中、R4年度 工事実施予定	
		誘導情報案内設備の整備・改良	施設の配置案内図を設置	●				
		施設の整備改良	誘導・警告ブロックの敷設・改良		●		誘導ブロックの洗浄を実施。	
			案内情報設備の充実・改良	●				
			多機能トイレの改良(照明具の改良)	●				
6	道路	既設道路の改良	段差の改善	▲	▲	○		
			舗装面の改善	▲	▲	○		
			横断勾配の改善	▲	▲	○		
			道路照明灯の整備			○	桃山台62号線(南側)の照明等整備を、R3以降の 梶美木多駅前南広場線整備に合わせて実施予定。	
		誘導・警告ブロックの敷設・改良		▲	▲	○		
		案内・誘導サインの設置・改良				○		
		側溝蓋・グレーチングの設置・改良		▲	▲	○		
				H30 桃山台61号線、桃山台62号線(南側一部)、赤坂台庭城台線 実施完了 R1～R2 桃山台62号線(北側一部)、桃山台64号線、原山台102号線 実施完了 R4以降 桃山台62号線(南側・北側残り)、桃山台132号線、梶美木多駅前北広場線、梶美木多駅前南広場線 ※桃山台62号線(南側・北側残り)、梶美木多駅前北広場線、梶美木多駅前南広場線は他事業関連として実施予定。 ※桃山台62号線(南側)の照明等整備を、R3以降の梶美木多駅前南広場線整備に合わせて実施予定。				

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定

		整備項目		～H30	R1 R2	R3～	備考	資料 ページ
7	信号 交差点 交通規制	既設信号の改良	音響信号等の設置・改良	●				
			視覚障害者用道路横断帯の設置		●		平成30年度南区役所前に設置済。	

○樫・美木多駅周辺における整備項目以外の整備

				整備時期			備考	資料 ページ
		内容		～H30	R1 R2	R3～		
—	駅前広場 (北側)	設備・施設の改良	エレベーターの設置			○	今後の駅前広場整備にあわせて実施予定 (R5年度実施予定) H31年2月に当事者参加による現地確認を実施	

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定

整備状況調査 整備状況 一覧

②津久野駅周辺				整備時期			備考	資料 ページ
		整備項目		～H30	R1 R2	R3～		
1	津久野駅	旅客施設の個別設備	内方線ブロックの整備	●				
		設備・施設の改良	券売機の車いす対応(蹴込設置等)			○	実施時期未定	
		その他	筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				
			コミュニケーションボードの導入	●				
2	駅前広場	誘導情報案内施設の整備	バス路線図等の設置	●				
			主要施設案内図の設置	●				
		設備・施設の改良	ベンチ等の設置	●				
		その他	バス停分散の解消	●				
3-1	家原大池 体育館	誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの改良			○	予算措置次第実施予定。	
			音響案内設備の改修(エレベーター)			○		
		設備・施設の改良・整備	多機能トイレの改良(オストメイト対応)			○		
		その他	筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				
			コミュニケーションボードの導入	●				
			ファックスが利用可能であることの掲示	●				

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定

		整備項目		～H30	R1 R2	R3～	備考	資料 ページ
3-2	鳳郵便局	誘導案内情報施設の整備	誘導・警告ブロックの改良				調整中。	
			案内情報設備の改修 (スロープを示す車いすシンボルマーク)	●				
		設備・施設の改良・整備	開扉の自動扉化(ATM出入口)	▲			通常出入り口は自動扉、 土日用ATM出入り口の自動化は、建て替えが 必要であるため、現時点では整備未定。	
			ATMの改良(車いす使用者対応)	●			蹴り込みのある仕様のATMを設置。	
		車いす使用者用駐車施設の 整備・改良	車いす使用者用駐車施設の改良 (車いすシンボルマーク)		●			
		その他	筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				
			コミュニケーションボードの導入	●				
3-3	イトーヨーカ ドー津久野店	誘導案内情報施設の整備	非常口誘導灯の改修(聴覚障害者対応)	●				
			音声案内装置の設置(トイレ入口)	●				
		その他	筆談具の設置	●				
			筆談対応可能表記	●				
			コミュニケーションボードの導入	●				
			大画面液晶ディスプレイ等を活用した広告情報の表示	●				
3-4	デイリーカナ ート向ヶ丘店	視覚障害者誘導施設の整備	誘導・警告ブロックの敷設			○	調整・検討中。道路、建物の所有者が異なる ため協議中。	11
		誘導案内情報施設の整備	案内情報設備の充実(トイレの誘導サイン)		●			
		設備・施設の改良・整備	多機能トイレの設置			○		
			トイレの改良 (フック・SOSボタン・洋式化、便房内点字表記)		△	○	令和3年6月洋式化(男女1か所ずつ)完了	
		その他	レジ、通路での幅員確保	●				
			放置自転車への適切な駐輪指導、整頓	●				

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
▲…一部実施済み △…一部実施予定


		整備項目		～H30	R1 R2	R3～	備考	資料 ページ
3-5	ダイエーグルメ シティ津久野店	視覚障害者誘導施設の整備	誘導・警告ブロックの敷設		●			
		誘導案内情報施設の整備	案内情報設備の充実		●			
		設備・施設の改良・整備	トイレの改良(フック・SOSボタン・便房内点字表記)		●			
		その他	車いす使用者用駐車施設の設置				隔地駐車場を賃借。	
			筆談具の設置		●			
			筆談対応可能表記		●			
			コミュニケーションボードの導入			●	令和3年2月導入予定	
4	道路	既設道路の改良	段差の改善		▲	●	～H29 : 津久野18号線 実施完了 H30 : 府道大阪高石線(現)実施完了 R1～R2: 下田津久野2号線 実施完了 R3 : 下田津久野2号線(2期) 実施完了	12
			舗装面の改善	▲	▲	●		
			横断勾配の改善	▲	▲	●		
		誘導・警告ブロックの敷設・改良		▲	▲	●		
5	信号・交差点、 交通規制	既設信号の改良	音響信号等の設置・改良	●				
			視覚障害者用道路横断帯の設置			○	調整中につき、設置未定。	
		(参考) 特定路線上における交通規制表示の更改			●		横断歩道及び停止線:1か所、一時停止:1か所	

凡例: ●…実施済み ○…実施予定
 ▲…一部実施済み △…一部実施予定


整備内容	【泉北高速鉄道柵・美木多駅周辺地区】 （２）駅前広場等 エレベーターの設置（南側）
------	--



整備内容	<p>【泉北高速鉄道柵・美木多駅周辺地区】</p> <p>3-2 柵文化会館</p> <p>多機能トイレの改良（オストメイト対応、水栓ボタン、荷物置き用の台）</p>
------	---

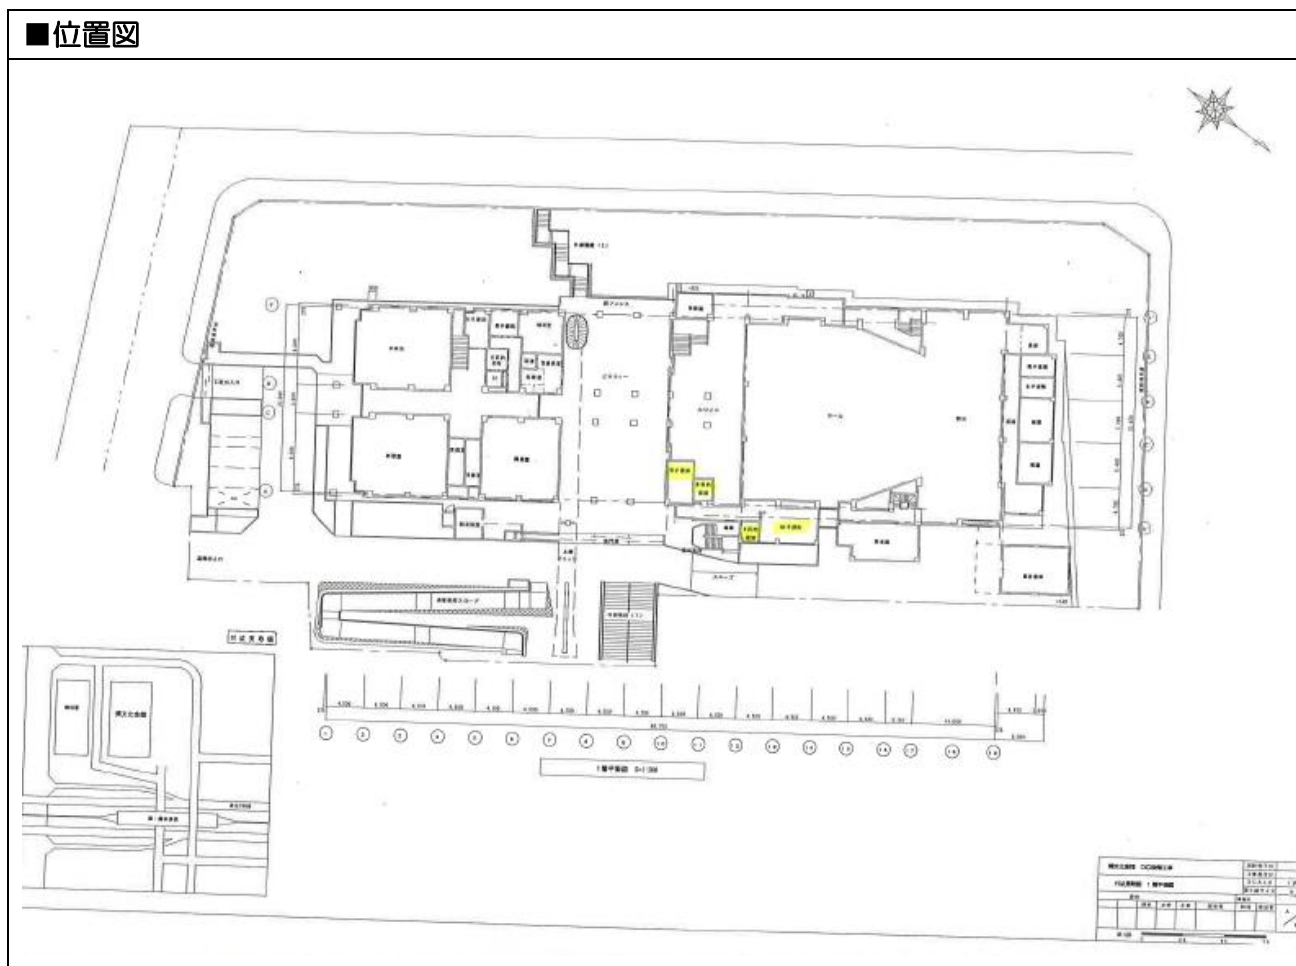


整備内容	【泉北高速鉄道梅・美木多駅周辺地区】 3-2 梅文化会館 トイレの改良（荷物フック）
------	---

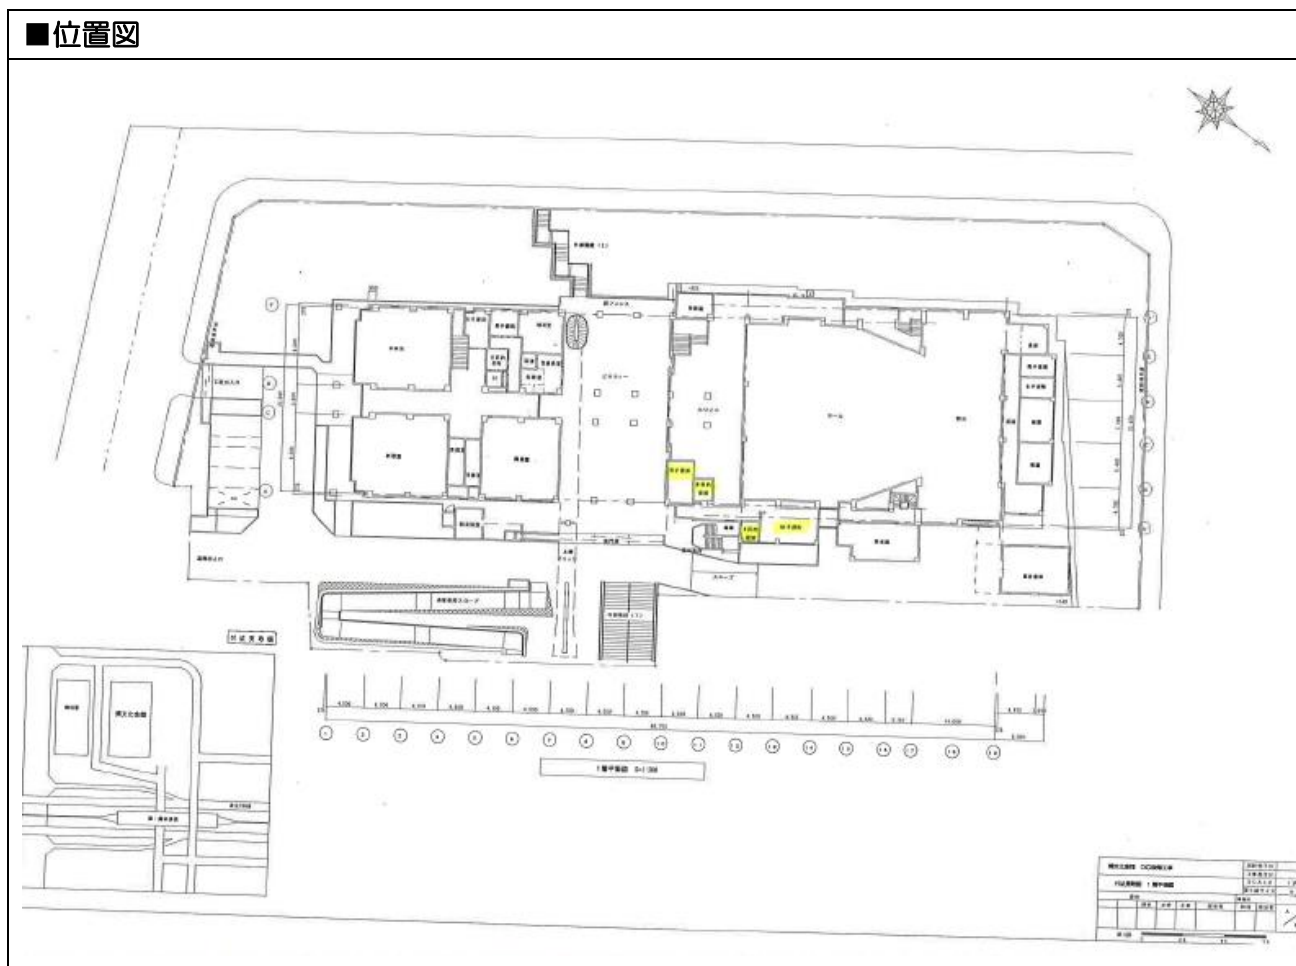

整備内容	【ＪＲ津久野駅周辺地区】 デイリーカーナート向ヶ丘店 トイレの洋式化
------	---

■位置図

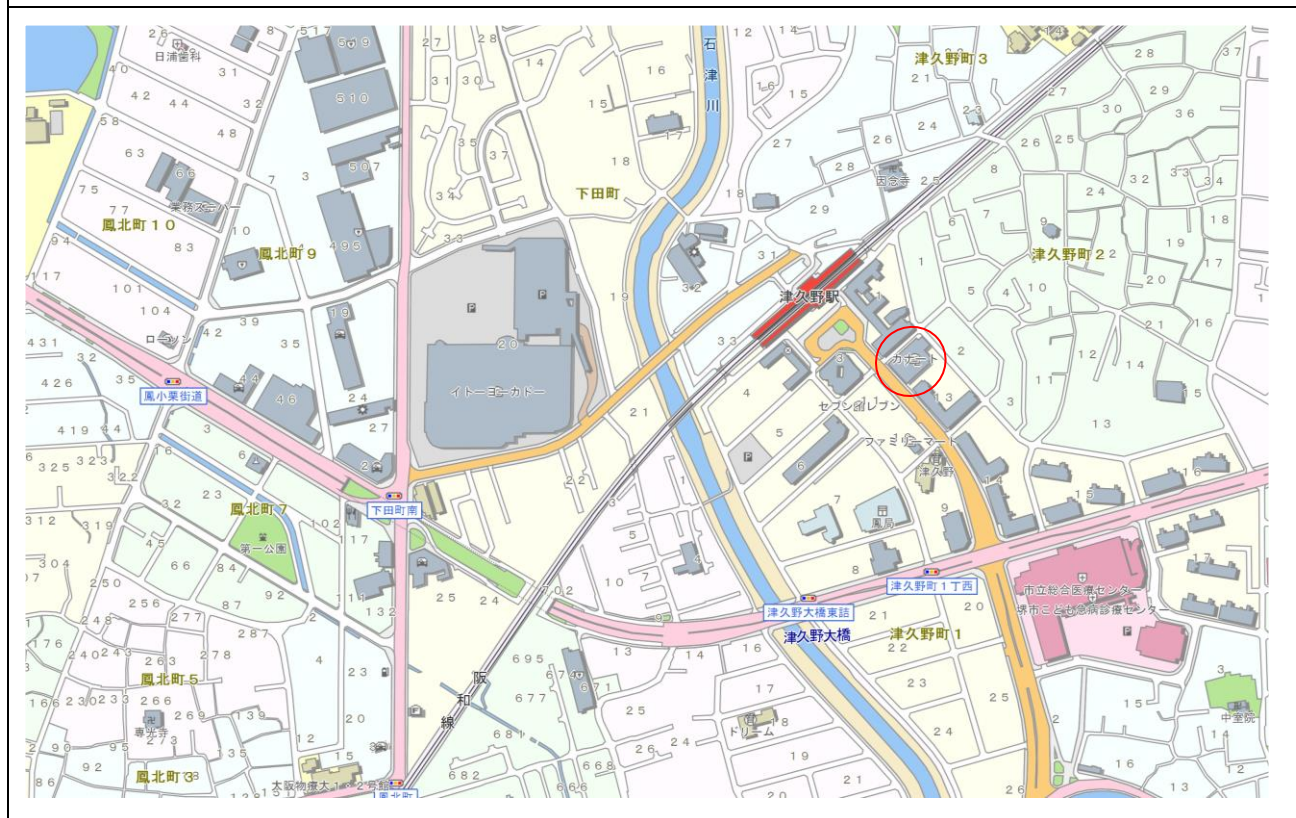

■事後写真① 男子トイレ




■事後写真② 女子トイレ



整備内容	【ＪＲ津久野駅周辺地区】 段差の改善、舗装面の改善、横断勾配の改善 誘導・警告ブロックの敷設・改良
------	--

■位置図

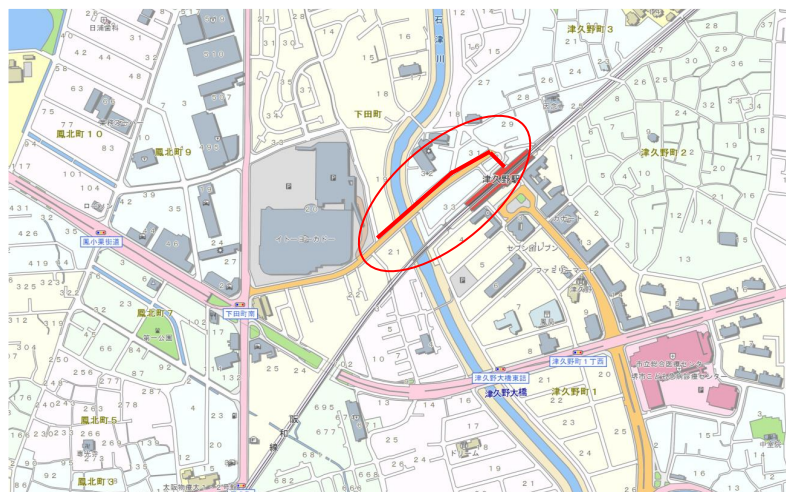

■事前写真①



■事前写真②



■事後写真①



■事後写真②

