記 載 例

管理番号	

※管理番号は記入しないでください。

【B－○】

簡　易　な　施　工　計　画
（○○○○○○○○○○）

案件名称　　○○○○○工事

具　体　的　な　施　工　計　画

現場状況を踏まえて、特に重要と思われる施工上の留意点一つを箇条書きする

1．工事車両の増加に伴う渋滞対策について

当工事は飲食店も混在するオフィス街を通る府道に面しており、昼間の渋滞対策が課題となっていることから、工事車両の増加に伴う渋滞対策を講じる必要がある。　理由

留意点に対して具体的な理由を記載する

工事車両の縮減や平準化の調整を行うとともに、工事車両の通行が予想される時間帯の車利用の自粛を呼びかける広報として、事前に周辺の飲食店やオフィス等にチラシ等の配布し、協力を依頼する。　対策

留意点に対して具体的な対策を記載する

現場状況を踏まえて、特に重要と思われる施工上の留意点一つを箇条書きする

2．○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○

記 載 例

管理番号	

※管理番号は記入しないでください。

【B－6】

工事の着工日は別表に指定した日付とする。

簡易な施工計画（工程表）

案件名称：　○○○○○工事

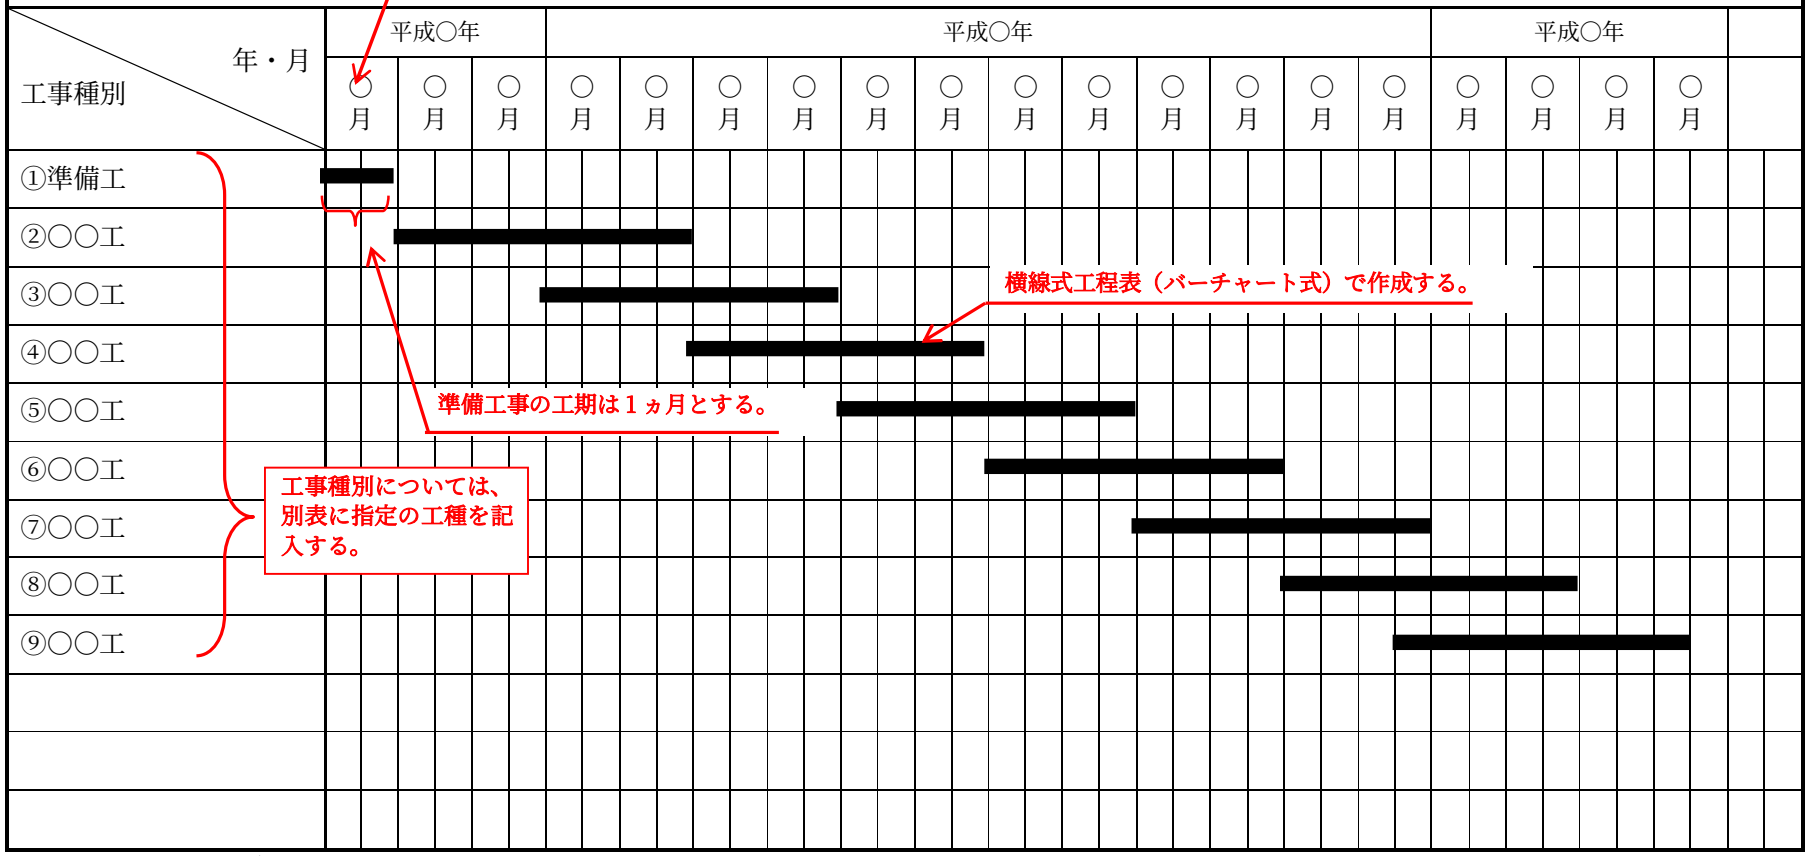

チェックリスト（提出前に確認してください）

申請者確認欄	チ　ェ　ッ　ク　項　目	堺市確認欄
□	**別表で指定する工種を「工事種別」欄にすべて記載していますか。** →指定する工種の記載漏れがある場合、加算点は０点となるので注意してください。	
□	工事の着工日は、別表に指定した日付と仮定して、横線式工程表（バーチャート式）で記載していますか。	
